

(1) 工事概要

工事概要

本工事は、国道349号における、道路改良工事である。主な工種は道路土工・地盤改良工・法面工・擁壁工・排水構造物工・構造物撤去工・仮設工であり、それぞれ掘削工40m<sup>3</sup>・路体盛土工2500m<sup>3</sup>・路体外盛土工1700m<sup>3</sup>・路床盛土工 2400m<sup>3</sup>・法面整形工1式・地盤改良工396m<sup>3</sup>・法面工310m<sup>2</sup>・擁壁工1式・排水構造物工1式・構造物撤去工1式・仮設工1式である。

工事名 丸森地区構造物工事

河川名（又は路線名） 国道349号

工事場所 宮城県伊具郡丸森町耕野字不動 地内

工 期 自 令 和 5 年 11 月 28 日

至 令 和 6 年 11 月 29 日

請負代金 424,666,000 円 （税込）

発注者 国土交通省 東北地方整備局

TEL 022-225-2171

宮城南部復興事務所

所在地 〒981-2162 宮城県伊具郡丸森町字除北20

TEL 0224-51-8290

受注者 りんかい日産建設株式会社

所在地 〒980-8505 宮城県仙台市青葉区北目町6-8

TEL 022-225-5547

（作業所）

所在地 〒960-0708 福島県伊達市梁川町字東塩野川71-1

TEL 024-563-5745

## 現場事務所 位置図




りんかい日産建設(株)丸森作業所  
〒960-0708  
福島県伊達市梁川町字東塩野川71-1  
TEL 024-563-5745

現場事務所～現場  
約5.3km  
車で7分

# 土砂仮置場 マップ


R6.05.21

## 丸森地区構造物工事

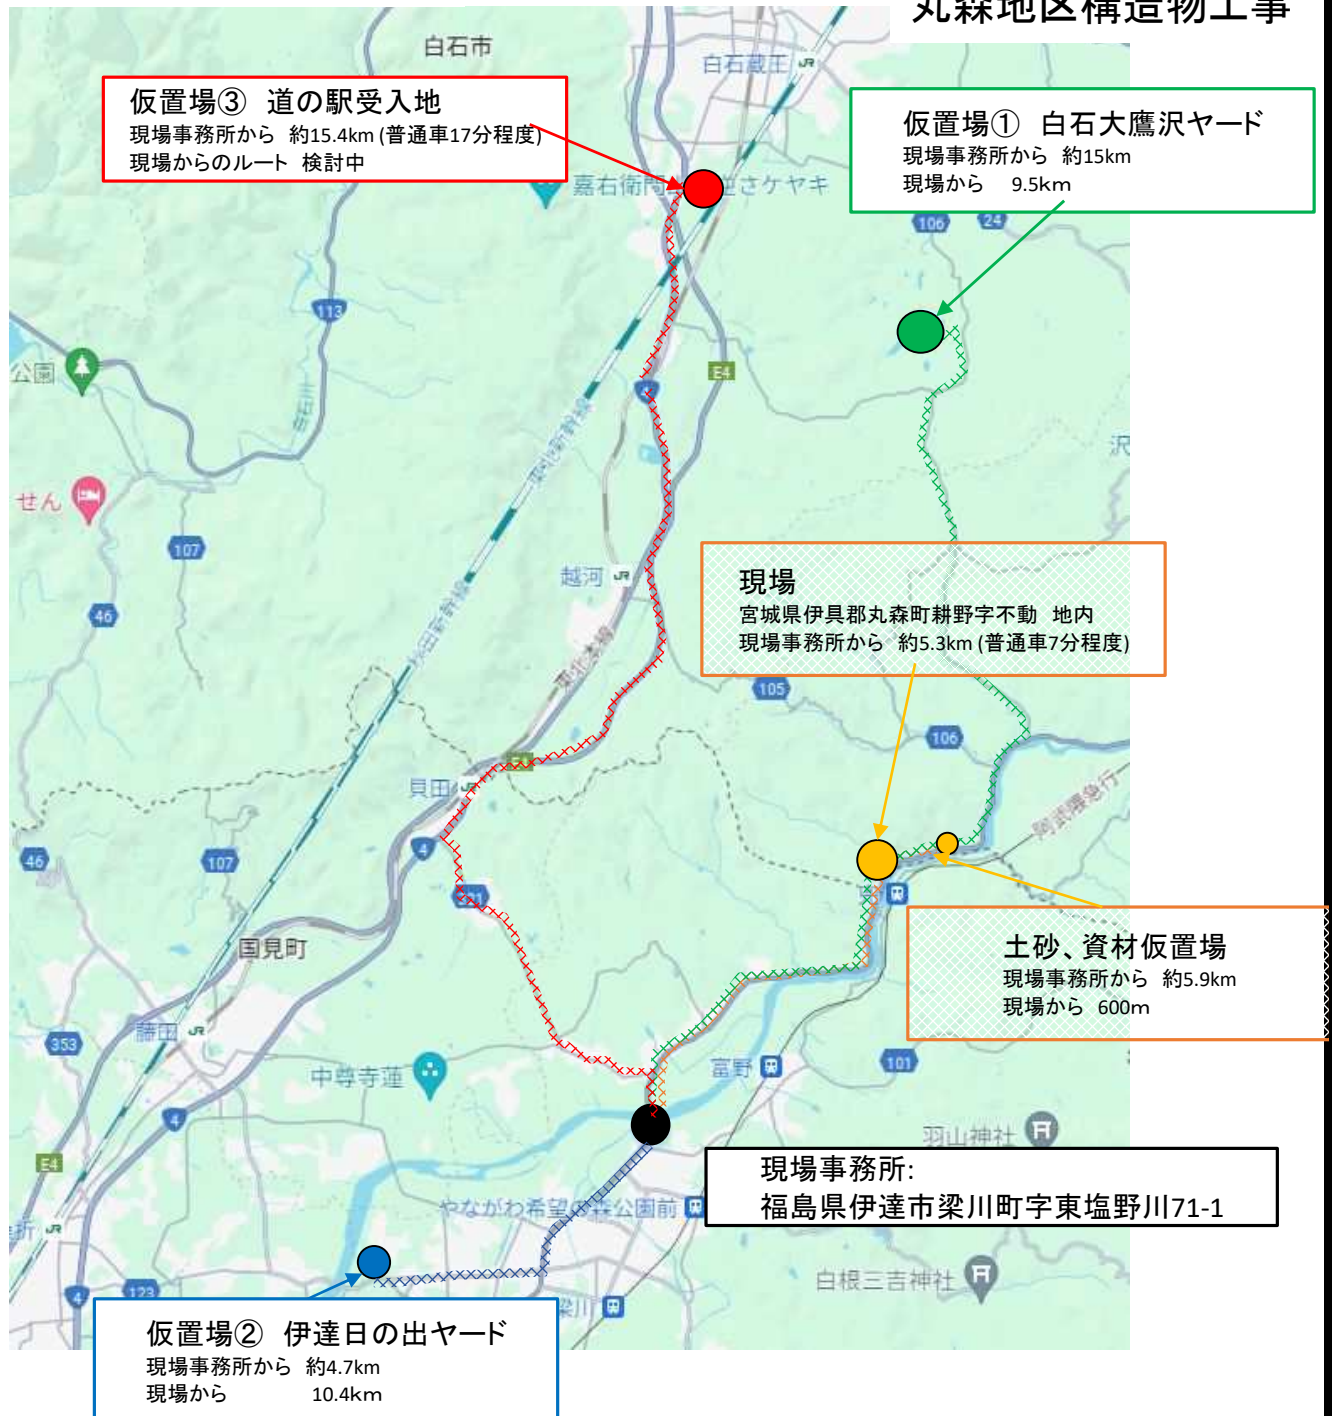

現場事務所	福島県伊達市梁川町字東塩野川71-1	※事務所から	※現場から
現場	宮城県伊具郡丸森町耕野字不動 地内	約5.3km	
土砂、資材仮置場	宮城県伊具郡丸森町字岩11-1	約5.9km	約600m
仮置場①	白石大鷹沢ヤード 宮城県白石市大鷹沢三沢逆川	約15.0km	約9.5km
仮置場②	伊達日の出ヤード 伊達市保原町中瀬日の出2-1	約4.7km	約10.4km
仮置場③	道の駅受入地 宮城県白石市大平中目中田	約15.4km	-



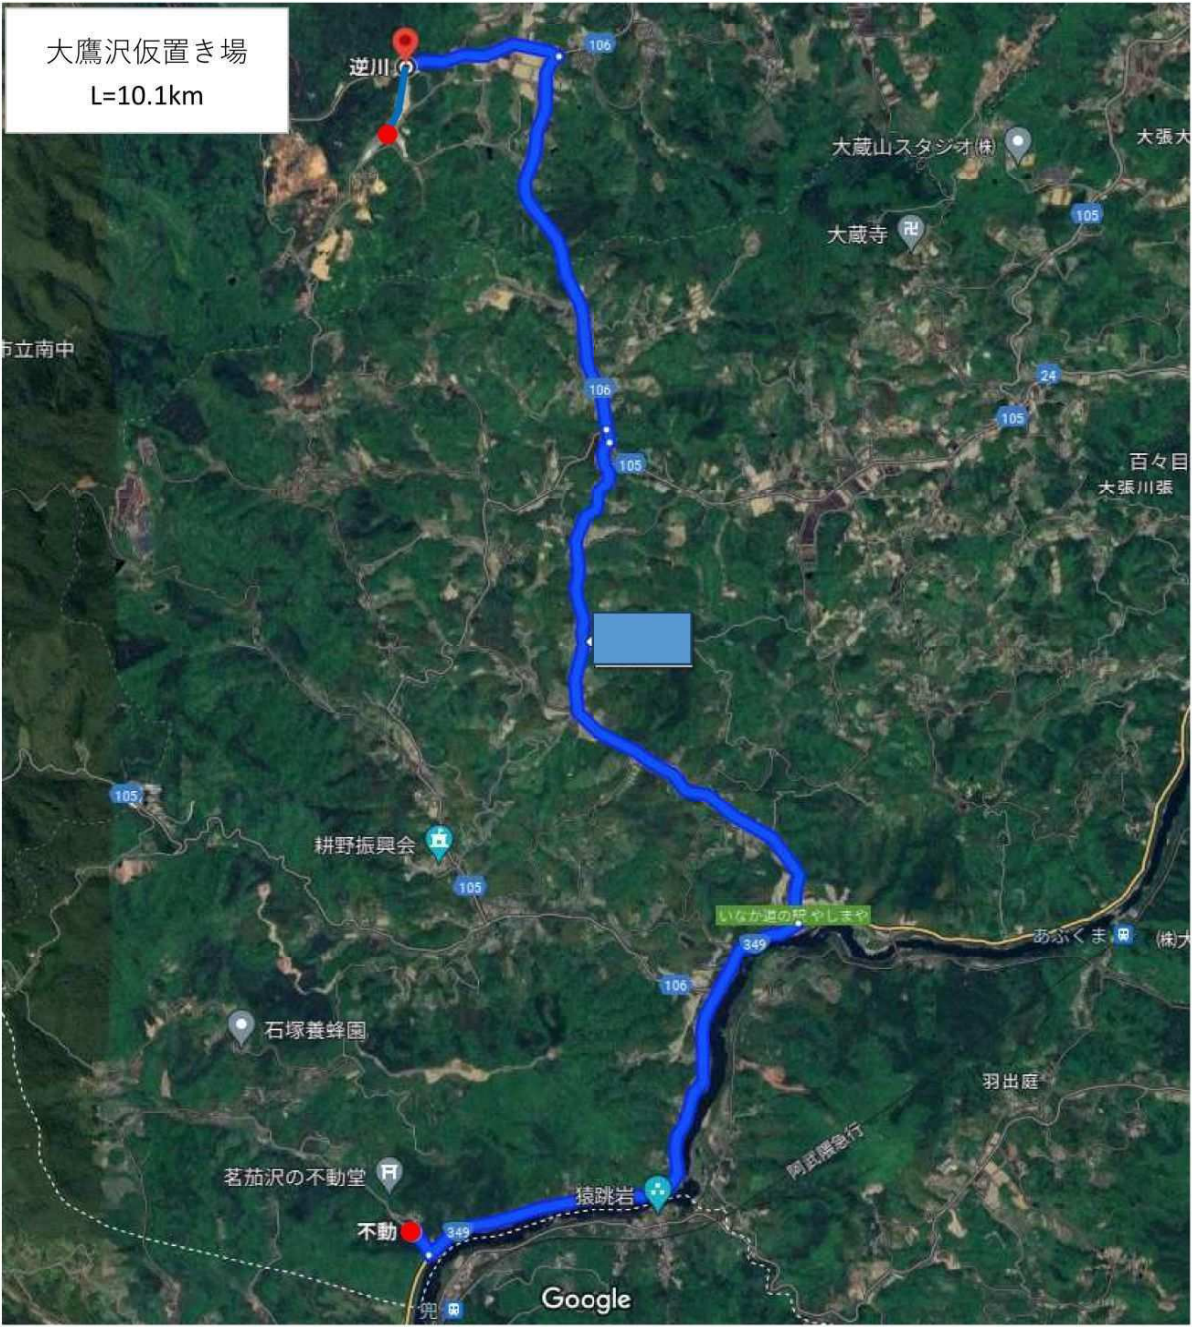

1号トンネル ⇄ 国道349号 ⇄ 八巻矢城線 ⇄ 大鷹沢仮置き場

凡例

- 運行経路
- 積込・荷降し箇所



現場全景





